

农业基本建设项目竣工验收表

项目名称： 2020 年生猪规模化养殖场建设项目

建设单位名称： 永安市飞明农牧有限公司

建设项目省级主管部门： 福建省农业农村厅

验收组织单位（公章）： 三明市农业农村局

填报时间： 2026 年 1 月 23 日

中华人民共和国农业农村部 制

一、项目基本情况表

建设项目名称： 2020 年生猪规模化养殖场建设项目	
建设单位：永安市飞明农牧有限公司	
建设单位法定代表人： 高鹏程	电话： 18350116612
建设单位联系地址：永安市安砂镇江后村	邮编： 366021
项目立项审批文号、时间：发改办农经〔2019〕899 号，2019 年 9 月 17 日	
初步设计审批部门、文号、时间：永安市农业农村局，永政农办〔2019〕69 号，2019 年 10 月 14 日	
是否组织初验： 是	项目初验时间： 2025 年 12 月 15 日
建设单位申请竣工验收时间：2026 年 1 月 9 日	竣工验收日期：2026 年 1 月 23 日
竣工验收组织单位： 三明市农业农村局	联系人：张占春 电话：13599358048

二、建设内容完成情况


批复建设地点：永安市安砂镇江后村 实际建设地点：永安市安砂镇江后村
初步设计（或可研）批复的建设内容及规模 ¹ ： 一、基础设施建设：1. 新建砖混结构猪舍 7000m ² 、钢结构猪舍 13000m ² ；2. 建设挡墙 1 座；3. 变电房 1 座；4. 综合用房 1 座；5. 消毒间 1 座；6. 饲料厂房 1 座；7. 饮用水水塔 1 座。二、自动化饲喂系统设施：1. 料线系统；2. 外输送系统；3. 给水系统。 三、养殖环境控制设施设备：1. 排污系统；2. 环控系统。四、栏位系统。五、附属设施：1. 配电系统；2. 集中管理报警系统；3. 玉米原料仓及加工厂机械。六、水、电、路“三通一平”（含林地植被恢复补偿费、青苗补偿费）等工程。
完成的建设内容及规模： 一、基础设施建设：1. 新建砖混结构猪舍 8856.76m ² 、钢结构猪舍 130726.88m ² ；2. 建设挡墙 1 座；3. 变电房 1 座；4. 综合用房 1 座；5. 消毒间 1 座；6. 饲料厂房 1 座；7. 饮用水水塔 1 座。二、自动化饲喂系统设施：1. 料线系统；2. 外输送系统；3. 给水系统。 三、养殖环境控制设施设备：1. 排污系统；2. 环控系统。四、栏位系统。五、附属设施：1. 配电系统；2. 集中管理报警系统；3. 玉米原料仓及加工厂机械。六、水、电、路“三通一平”（含林地植被恢复补偿费、青苗补偿费）等工程。
未完成的建设内容及规模： 无
重大变更： 无
非重大变更： 无
履行基本建设程序情况： 履行

竣工验收组评价：

一、基础设施建设：1. 新建砖混结构猪舍 8856.76m²、钢结构猪舍 130726.88m²；2. 建设挡墙 1 座；3. 变电房 1 座；4. 综合用房 1 座；5. 消毒间 1 座；6. 饲料厂房 1 座；7. 饮用水水塔 1 座。二、自动化饲喂系统设施：1. 料线系统；2. 外输送系统；3. 给水系统。

三、养殖环境控制设施设备：1. 排污系统；2. 环控系统。四、栏位系统。五、附属设施：1. 配电系统；2. 集中管理报警系统；3. 玉米原料仓及加工厂机械。六、水、电、路“三通一平”（含林地植被恢复补偿费、青苗补偿费）等工程。

专家签字：



1 没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。

三、建设项目建设管理情况

设计	初步设计编制单位：福建省农科农业发展有限公司		资质：工程设计农林
	行业农业综合开发生态工程专业		
	设计范围和内容的完整性：是		
	设计是否规范：是		
施工 承包	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：是		
	土建工程 ² 单位：福建益闽建设工程有限公司	资质：施工总承包三级	
	田间工程单位：无	资质：	
	设备安装单位：赣州百智鑫农牧科技有限公司	资质：	
建设 质量 ³	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：		
	建筑工程验收评定结果：合格		
	田间工程验收评定结果：		
	设备安装与运行验收评定结果：		
	竣工图完成情况：有		
	土建工程质量备案情况：		
	土建工程是否符合规划报建程序：		
法人责任 制	工程有无重大质量问题：		
	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）： 有		
合同 制	应签而未签订合同情况 ⁴ ：无		
	合同文本规范情况：有		
	合同执行情况：有		
招投 标制	招投标制执行情况：		
监理 制 ⁵	监理单位：		资质：
	监理范围：		
	监理内容：		
执行 法规	环保：	消防：	
	劳动安全卫生：	抗震设防：	
	其他国家强制性法规执行情况：		
竣工验收组评价：符合验收			
专家签字：			杨


2 渔港等项目包括水工。以下同。

3 工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。

4 指设计、施工、监理等类型的合同。

5 主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

四、资金⁶的使用情况

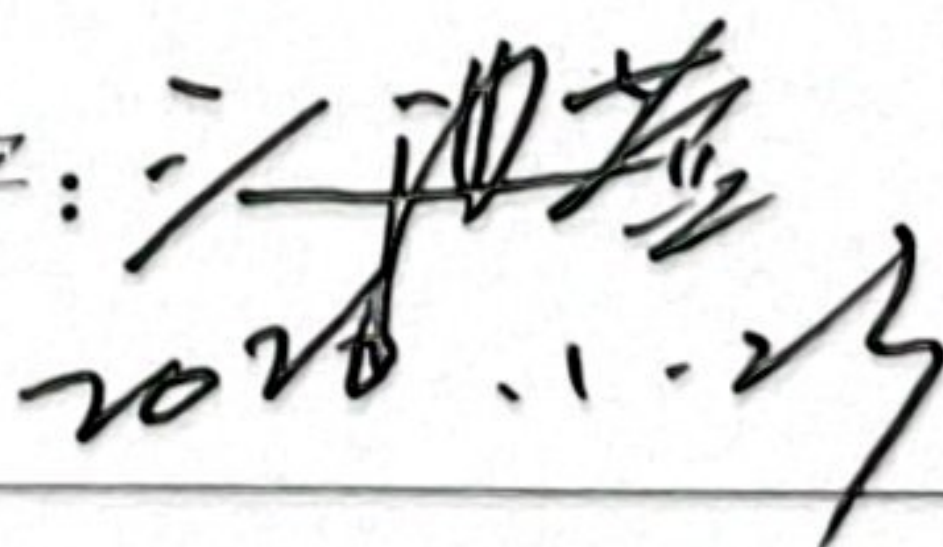立项批复情况	总投资：5000 万元 其中：中央投资：200 万元 地方配套：0 自筹资金：4800 万元		
	建筑工程：1580 万元 田间工程：0 仪器、设备：1000 万元 其他：2420 万元		
初步设计批复	总计：5000 万元 其中：建筑工程：1580 万元 田间工程：0 仪器、设备：1000 万元		
	工程建设其他费用：2400 万元 其他：20 万元		
资金到位情况	总计：1569.62 万元 其中：中央投资 省财政：地、县级财政：0 自有资金：1569.62 其他（请注明）：		
投资完成情况	总计：5005.2725 万元 建筑工程：3919.06 万元 田间工程：0 仪器、设备：523.08 万元 工程建设其他费用：563.06 万元 其他：		
形成资产	固定资产： 其他资产： 核销支出：		
竣工决算审计	类型	社会中介审计 内部审计 政府审计部门	
	单位	资质：	
	委托审计内容是否规范：		
	审计结论是否规范：		
概算调整和审批程序是否符合规定： 无			
财务制度建立及会计行为规范情况： 规范			
资金专帐管理、专款专用情况： 有			
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况： 无			
竣工验收组评价：			
 专家签字： 2020.1.23			

6 资金单位均为万元。7 仅指社会中介审计

五、项目文件管理情况

文件类型		管理情况 ⁸	文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项申请报告	有	执行阶段产生的资料	隐蔽工程验收记录	有
	项目建议书或可研报告	有		建材、仪器设备质量、试验记录	有
	项目立项批准文件	有		设备安装施工纪录	有
	有关决议、领导讲话、会议记录	有		工程质量事故报告及处理纪录	
	征用土地、拆迁、补偿等文件	有		分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	
	工程地质(水文、气象)勘察报告	有		其它(施工日记)	有
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	有	竣工阶段产生的资料	竣工图	有
	向地方报建的批准文件	有		施工单位报送甲方的竣工验收申请报告	有
	仪器设备采购合同及招投标文件	有		初验报告	有
	土建发包合同、协议、招投标文件	有		初验会议文件、会议决定	有
规划、消防、环保、劳动等部门审核文件	无	竣工决算		有	
执行阶段产生的资料	开工报告(大型项目)	无		竣工决算审计报告	有
	工程测量定位记录	有		工程建设总结和工作报告	有
	图纸会审、技术交底	有	竣工项目验收申请报告	有	
	施工组织设计等	有	其他		
	基础处理、基础工程施工文件材料	有			
	设备试运转报告				
竣工验收组对资料归档情况的评价:					
同意验收			专家签字: 杨芳		

8 可用有、无或完整、不完整等表述。

六、竣工验收意见

竣工验收结论：

2026年1月23日，三明市农业农村局组织专家组对永安市飞明农牧有限公司承担建设的2020年生猪规模化养殖场建设补助项目进行验收，专家组通过现场查看和查阅相关资料，建设内容与投资规模已全部完成，该项目有设立资金专项管理，符合项目建设要求，同意验收通过。

专家组签字：

杨青 洪燕 邵

建设单位意见：

同意验收组意见

(盖章)



竣工验收组织单位意见：

(盖章)



9 建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。

七、参加竣工验收人员名单及签名

姓名	单位	职务、职称	电话	签名
江永	市发改局	科长	13011312005	江永
朱毅	永年农业局	副局长	1896835333	朱毅
黄仁新	市发改局	科长		黄仁新
陈光强	财政局		18950968061	陈光强
王宁	发改局		13457858907	王宁
王宁	发改局	副科长	15759897423	王宁
王宁	永年农业局	站长	18020816720	王宁
王宁	永年农业局		13880505462	王宁
王宁	永年农业局	站长	1876058417	王宁
陈宝志	永年农业局		13788882797	陈宝志
王宁	永年农业局		15279026663	王宁
